

呈報停止工作事件

呈報者：葉子文 (KNT 308)

發生經過：

銷售部在與客戶簽定保養合約前，委派維修部主管在該新工地進行視察。其間，主管發現其中一部機組有潛在危險 - 墜落到建築物外，該機組非常靠近建築物的圍欄邊緣。

LEAD WITH
SAFETY

風險評估

為何停止工作：

因為更換過程中，有需要使用一至兩級的梯台才能觸及到機組頂部，將其控制箱的門打開，以進行維修或保養工作。但現有護欄的高度並能在這情況下提供足夠的保護，以免員工墜落到建築物外的風險。

處理方法：

主管立即向部門經理報告，通知客戶並向他們解釋其危害。其部門及銷售部經理更在其報價單上向客戶訂明，這個位置在未改善並提供足夠保護之前，我司不會與客戶簽訂保養合約及在該地點進行任何工作。

潛在危險：墜落
到建築物外

護欄（高約1m）



備註：


- 該事件已向全球總部匯報，並得到總公司高級管理層的充分肯定及高度讚揚。
- 表示這是一個卓越的模範，顯示我們對工地潛在的危害能及早在簽訂合約前已識別出來，避免員工置身在這些風險當中。
- 管理層更期望各位員工能效法這位主管及其經理們，能積極支持並匯報這些類似的事件，一起提高整體的安全水平，及早預防，避免意外的發生。



機場安全嘉許計劃

「機場安全嘉許計劃」由機管局每年舉辦，旨在表揚機場社區於過去一年在安全標準方面及保持安全工作環境方面的模範企業。

在眾多機場社區成員中，開利憑著高質的工程服務及卓越的安全表現獲頒大獎。恭喜得獎的機場組，再次感謝各位員工的努力及付出。


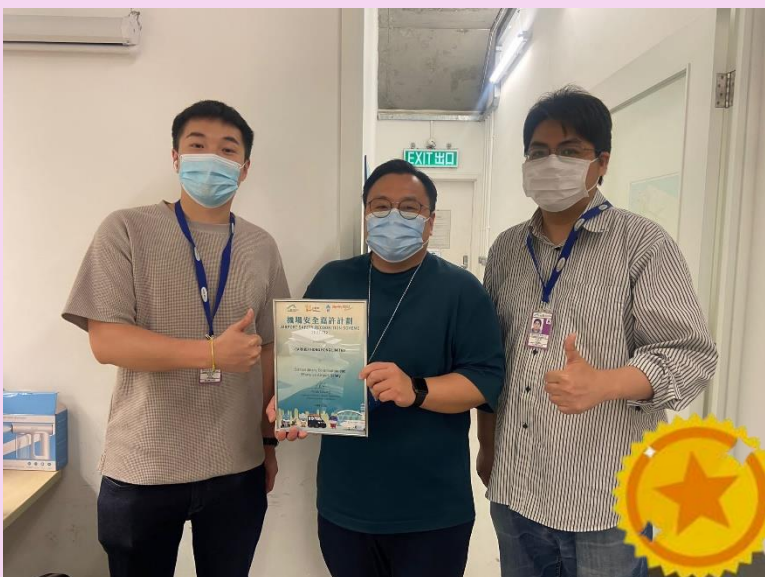


香港開利環境、健康及安全通訊

安全審核結果

在安全審核中發現員不正確佩帶口罩，對員工健康構成危害。

現提醒所有員工必需以正確的方法佩帶口罩，以確保口罩能發揮其有效性，減輕因工序而對員工構成的危害，保障員工的健康。





在安全審核中發現員工佩帶絕緣手套進行非電力工作，此舉容易對絕緣手套造成損壞。

現提醒所有員工進行非電力工序時切勿佩帶絕緣手套，以免工作期間的尖脫部份對絕緣手套造成破損。

在安全審核中發現兩名員工進行上鎖掛牌工序，但只有一名員工掛上鎖頭及警告牌，違反公司的規定。

提醒所有員工進行上鎖掛牌時必需每位參與工作的員工均掛上鎖頭及警告牌，以策安全。



在安全審核中發現員工測試絕緣手套時沒有將絕緣手套靠近面部及頸部，同時使用觸覺及聽覺檢查絕緣手套，未能有效確保手套沒有損壞。

提員工測試絕緣手套時必須將手套靠近面部及頸部，同時使用觸覺及聽覺檢查絕緣手套，以策安全。



香港開利環境、健康及安全通訊

自我風險評估 暨 假天花內進行電力工作風險評估

為完善公司的工作安全系統及滿足機電工程署於工作安全指引的最新要求,本部門對現有的「自我風險評估表」表格進行更新 (ver 23), 於首頁之「電力維修工作及使用電動工具」增設了 **C2** 選項新增了「於假天花內進行電力工作」評估的部份。各員工於工作前進行風險評估時,需識別是否包括於假天花內進行電力工作之潛在風險,以作出相對應的控制措施,以策安全。

請各同事將舊的自我風險評估表更新至最新的 **Rev23** 版本,並即時生效!!!

各同事請注意,任何包括於假天花內進行電力工作之工地,均需於開始工作前完成「自我風險評估表」(第一部份)及「於假天花內進行電力工作的風險評估報告」(第二部份),以符合機電工程署的最新指引。

Carrier 自我風險評估報告表(第一部份) 日期: _____

各員工/承辦商在工地開工前,必須參閱首頁的「自我風險評估表」來評估該項工作的風險並用以下的「自我風險評估報告表」確認。

請以☑表示此事項已檢查並達至安全水平;以“N”表示「不適用」。

如填寫圖之項目,請在“E”項詳述不安全之事項(可參照「自我風險評估表」內項目的編號說明)及詳述預防和控制措施。

以下任何一項發現不安全而又未能更正前,不可進行該項工作。

檢查項目		
A.1	進行該工作前已持有相關及有效之牌照及許可證	☐
A.1.1		
A.2	已佩戴相關、合適及足夠的個人防護裝備	☐
B	檢查工地之工作環境及了解緊急逃生路線和集合點	☐
C.1	電力維修工作及使用電動工具	☐
C.2	於假天花內進行電力工作 (並必須完成“第二部份”於假天花內進行電力工作的風險評估報告)	☐
D	高空工作(使用工作平台、梯子及防墮裝置) (必須依照「預防高空工作守則」進行檢查)	☐
以下之項目如“全部”都不適用,則可在右方空格內填一個“N”代表:否則,便要逐項填寫了。		
E	使用壓縮氣體/切割及焊接/砂輪切割/起重或吊重裝置 (圖出使用項目)	☐
F	貯存及處理化學物品/檢查及處理各種系統/處理油污或危險廢料/ 清理化學廢物(圖出使用項目)	☐
G	密閉空間 - 已進行氣體測試、危險評估;檢查及配備足夠的個人防護 裝備、工具及措施	☐
H	其他:	☐
I. A-H 項不安全之事項及其預防和控制措施		
組別/承辦商公司 名稱: _____ 員工/承辦商姓名及 編號: _____ 地點名稱: (大廈: _____) 工單編號: _____ (樓層: _____) (單位: _____) (由開利填寫)		



於假天花內進行電力工作的風險評估報告

(第二部份)

****請以☑表示所進行之工種****

工種	工序	危害 (頻率、嚴重性、風險)*	控制措施	餘下概率、餘下風險†	負責人及目標完成日期
☐更換/維修閘門/風扇/摩打/風機	- 工地保護	- 人體下墮 (3, 3, 9)	- 配戴安全帽及頸繩 - 嚴禁任何人進入或在易碎的假天花或同類不安全地方工作 - 如須進入及在此類地方工作,提供及妥為使用合適的進出途徑/作支持用的設施/工作平台	- [2, 2, 4] []	註冊電工於施工前完成
☐更換/維修其他冷氣系統組件(請詳述)	- 使用梯台/工作台/流動升降工作台	- 人體下墮 (3, 3, 9)	- 在1.83米以下使用合適的梯台並在使用的時候檢查是處於安全可用狀態;在1.83米以上可使用由曾受訓練的工人搭拆並由合資格人士監督搭拆過程的工作台/使用流動升降工作台,必須由受訓的工人操作,已附上有效檢測表格/證書及在使用時配戴安全帶並固定在指定的固定點上 - 有需要時,使用全身式安全帶並固定在固定點上	- [2, 2, 4] []	
	- 打開假天花	- 物件下墮 (3, 3, 9)	- 配戴安全帽及頸繩 - 圍封工地 - 盡量減少設備和零件帶到高位上	- [2, 2, 4] []	
	- 還原假天花	- 體力處理操作引致背部/手部受傷 (3, 2, 6)	- 提供安全進出通道 - 提供體力處理操作訓練 - 正確搬運姿勢 - 工作時配戴防割手套及防安全鞋 - 提供機械輔助工具(例如手推車)以將設備提升或運送	- [2, 2, 4] []	
	- 工地整理	- 觸電 (3, 3, 9)	- 註冊電工評估並消除在工作地點、工作區域附近地方(1.5米以內),以及其通道內可能不經意接觸帶電導體/帶電電力裝置電部分的風險 - 註冊電工關上及為附近的電力裝置進行上鎖、掛牌及測試程序 - 電工須使用防水絲頭及電斷路器以防觸電	- [2, 2, 4] []	
		- 絆倒/滑倒/跌倒 (3, 2, 6)	- 保持工地整理及安全進出通道 - 工人必須穿著防滑安全鞋	- [2, 2, 4] []	

*註: 請參閱下頁的定義

Page 1 of 2

Rev 5, May 22

有關詳情請參閱以下連結:

自我風險評估暨 假天花內進行電力工作風險評估指引: [Microsoft Word - Self risk assessment_202005_rev 23 \(carrier.com.hk\)](https://www.carrier.com.hk/microsoft-word-self-risk-assessment-202005_rev-23)

自我風險評估暨 假天花內進行電力工作風險評估報告表: 填寫 自我風險評估報告表(第一部份)(Rev 23) 及 於假天花內進行電力工作的風險評估報告(第三部份)之指引 (carrier.com.hk)

「環境、健康
及安全」網址

QR Code

