

安全審核結果



員工配戴安全帽時，安全帽的帽膽調較過鬆或過緊，會影響安全帽的保護成效。





審核中發現員工完成上鎖掛牌隔離電源後進行維修工作時及員工搬運梯台時，**沒有除下絕緣防電手套**，此舉有機會對防電手套損壞，若員工未有及時發現，隨即進行帶電工作，便會對員工構成觸電的潛在危險。

因此，提醒員工在進行非電力工序時，需把防電手套除下才開始工作。

同時，亦提醒員工根據公司的最新指引表示，防電手套是需於**每次佩戴前進行測試**，測試時需將手套靠近耳邊或以頸下皮膚感受漏氣情況，以進一步確保手套沒有損壞。



安全審核結果

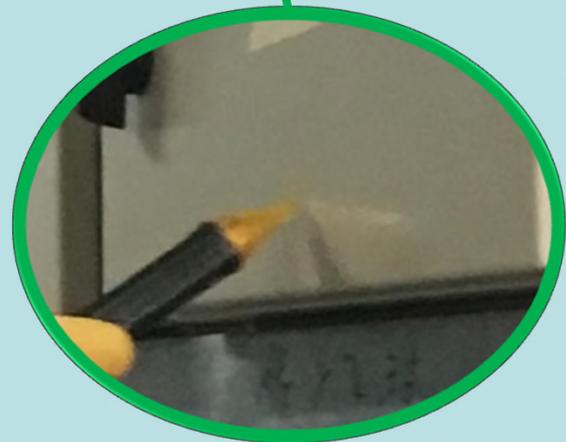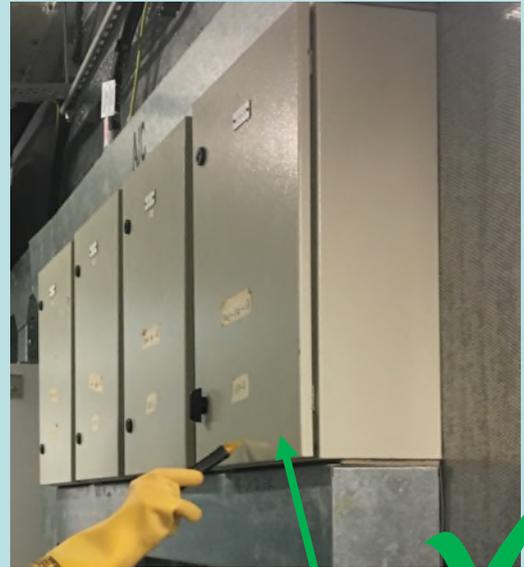


員工使用接地測試筆對設備外殼進行測試時，接地測試筆的筆尖與設備外殼沒有直接接觸，此舉會因測試筆與設備外殼之間的距離太遠，而導致存漏電的情況沒有顯示。有見及此，根據公司最新的指引表示，使用接地測試筆對設備外殼進行測試時，接地測試筆的筆尖必需與設備外殼直接接觸，以避免測試結果出現人為的誤差。





安全審核結果

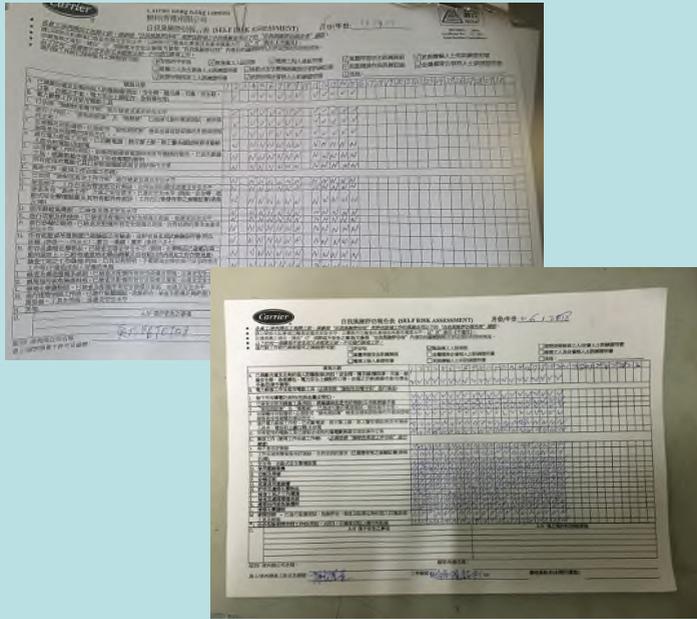

審核時發現員工使用舊版本的自我風險評估表。提醒員工為更有效確保各員工於開始工作前已檢查所有工作台的圍欄安全，安全部已於2017年11月份將原有之表格進行更新。

根據公司規定，自2018年5月1日起，所有員工均需使用現時最新版本自我風險評估表 (Rev 19, Nov 17)請各位留意。

員工可透過以下連結取得最新版本的表格：
<http://www.carrier.com.hk/ehs/hotform.html>

開利本地意外回顧

一名工人為後走道近天花位置的水管進行油漆工序時，從一把外借而來的A字梯梯頂墜下，引致小腿骨折。傷者在進行油漆工序時，一手握住油桶，另一手握著油掃來工作。此時，該工人一失平衡，便從梯頂墜下。

調查結果：

1. 沒有使用梯台工作，而使用把外借而來的A字梯來進行工作。
2. 沒有在施工前重溫高空工作守則卡及完成自我風險評估表
3. 沒有配戴安全帽

建議改善行動：

1. 使用我司之梯台來進行1.83米以下之高空工作，如在使用梯台時遇到困難，馬上向直屬上司/僱主聯絡
2. 不可使用別人的工具及設備來工作
3. 在施工前必須配戴足夠及合適的個人防護裝備，完成自我風險評估表及重溫工作守則卡





危害工地的改善情況

當員工進行保養工序時，發現客戶盛載化學物品的環保缸沒有以第二重容器盛載防止洩漏。員工聯絡客戶解釋相關之危害，並成功說服客戶添置防漏盤，保障在場人士的安全。



改善前



改善後

2018年截至5月各組別的安全表現領先排名

