




安全審核結果



在安全審核中發現於工地的磨輪沒有貼上法定的安全告示。現提醒各員工，工地使用之磨輪必需按照法定要求展示安全相關的安全告示。

在安全審核中發現工地的梯台沒有更新每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。





在安全審核中發現員工測試手套時，沒有將手套靠近耳邊或以頸下皮膚感受漏氣情況。



在安全審核中發現員工以金屬鉗開啟控制電箱的門，此舉會漏電而構成觸電危險。

現提醒所有員工必需使用合適的工具開啟電箱門，以免因員工誤觸碰漏電而導致觸電意外發生。

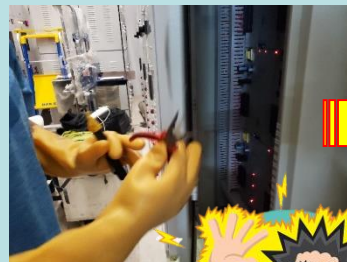

海外開利意外事故分享

意外回顧 – 體力處理操作

發生了什麼事？

1. 兩名倉庫搬運工人正在一同搬運AHU水盤到手推車上。
2. 每個水盤重38公斤，長3.3米，寬0.5米。
3. 其中一名工人在拉出水盤放到手推車時，他無法抓住水盤，水盤墜下時，水盤上的鋒利邊緣割傷了他的右腿。
4. 傷者被送往附近醫院進行治療，縫合了13針。

意外成因：

1. 員工在進行搬運時，不符合人體工程學要求（每人15公斤）。
2. 風險評估不夠詳盡，未能指出倉庫區域的大型物件處理流程之潛在危害。

預防措施：

1. 體力處理操作的風險評估，指出每人不可搬運多於15公斤。
2. 如處理15至30公斤的物料時，必須2人或以上一齊搬運，及由一名人員發施號令，確保各成員動作的配合及避免受傷。
3. 如處理30公斤以上的物料時，必須使用起重設備以作協助。
4. 配戴合適及足夠的個人防護裝備，包括及不限於防滑手套及安全鞋。
5. 不可在倉庫及工地範圍內穿著短褲。
6. 在可行情況下，除去物品尖銳的邊緣。
7. 體力處理操作的風險評估，指出每人不可搬運多於15公斤。如處理30公斤以上的物料時，必須使用起重設備以作協助。
8. 在可行情況下，除去物品尖銳的邊緣。






Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊



危害工地的改善情況

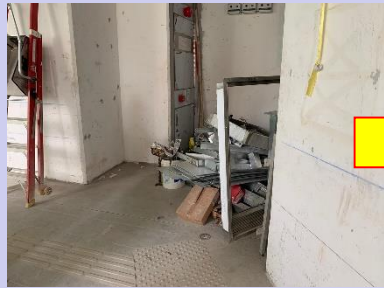

當員工進行保養工序時，發現前往天台機房的通道擺放了一些雜物，容易對員工構成絆腳之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶安排其屬下員工於擺放物料位置以圍欄圍封，以減低員工被物料絆倒而構成受傷的危險。

本年度最後一期安全問答比賽

2019年第六期的問答比賽已經推出了，請於十二月十六前 前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/r/field201912>
- 寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/r/office201912>

2019年截至11月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

