

2014年7月份整體的安全累積工時為：
1,311,878 小時

意外回顧

主題：嚴重受傷事故 - 人體從梯具下墮 - Chubb 比利時員工
地點：比利時客戶工地

發生了什麼事？

一名入職十二年的機械工程師在客戶工地進行自動灑水系統的水管接駁工序時，發生了人體從梯具下墮之意外。意外發生在施工的第三天，該名工程師從客戶借用了一條梯具，及把該梯具倚靠在一條水管上（圖二）以進行自動灑水系統的水管接駁工序（圖一）。在進行工序時，梯具向後滑動，他從5米高跌下，頭部首先著地。他即場昏迷了約三至四分鐘，頭部創傷及頸椎骨折。他被送往醫院，有望能完全康復。

調查結果：


- 客戶在工序進行前，已聲明可向該工程師提供流動升降台，但沒有被該工程師接納。
- 肇事梯具的梯腳沒有安裝防滑膠墊（圖三），而本公司已在工地提供了安全合適的梯具予員工使用。
- 肇事梯具過短，梯頂伸展至離擱置點只有幾厘米（圖一），梯具底部與高度並不能保持1:4之擺放斜度。
- 客戶在施工的第一天，在工地為工程師們提供了安全指引。而肇事工程師在該天並不在工地，因此安全資訊並沒有傳遞給他。

預防措施：

- 已提供棚架予以完成餘下工作。
- 提供高空工作及意外回顧之安全訓練予所有工程師。
- 在施工前，提供清晰的書面工作指引及風險評估予所有相關員工。


所有員工應緊記：

決不 使用破損之設備、梯具及儀器
總是 在使用設備、梯具及儀器前，作詳細檢討
總是 在施工前作周詳計劃（如使用流動升降台或棚架）
總是 為工序進行風險評估
總是 確保工作指引清晰明確

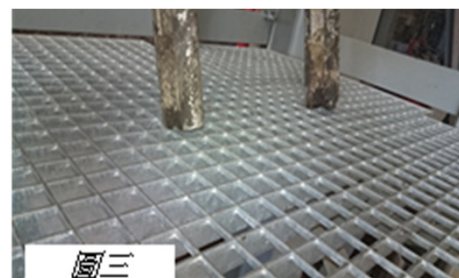

Safety 1st

2014年截至6月外勤員工各組別的安全表現總分

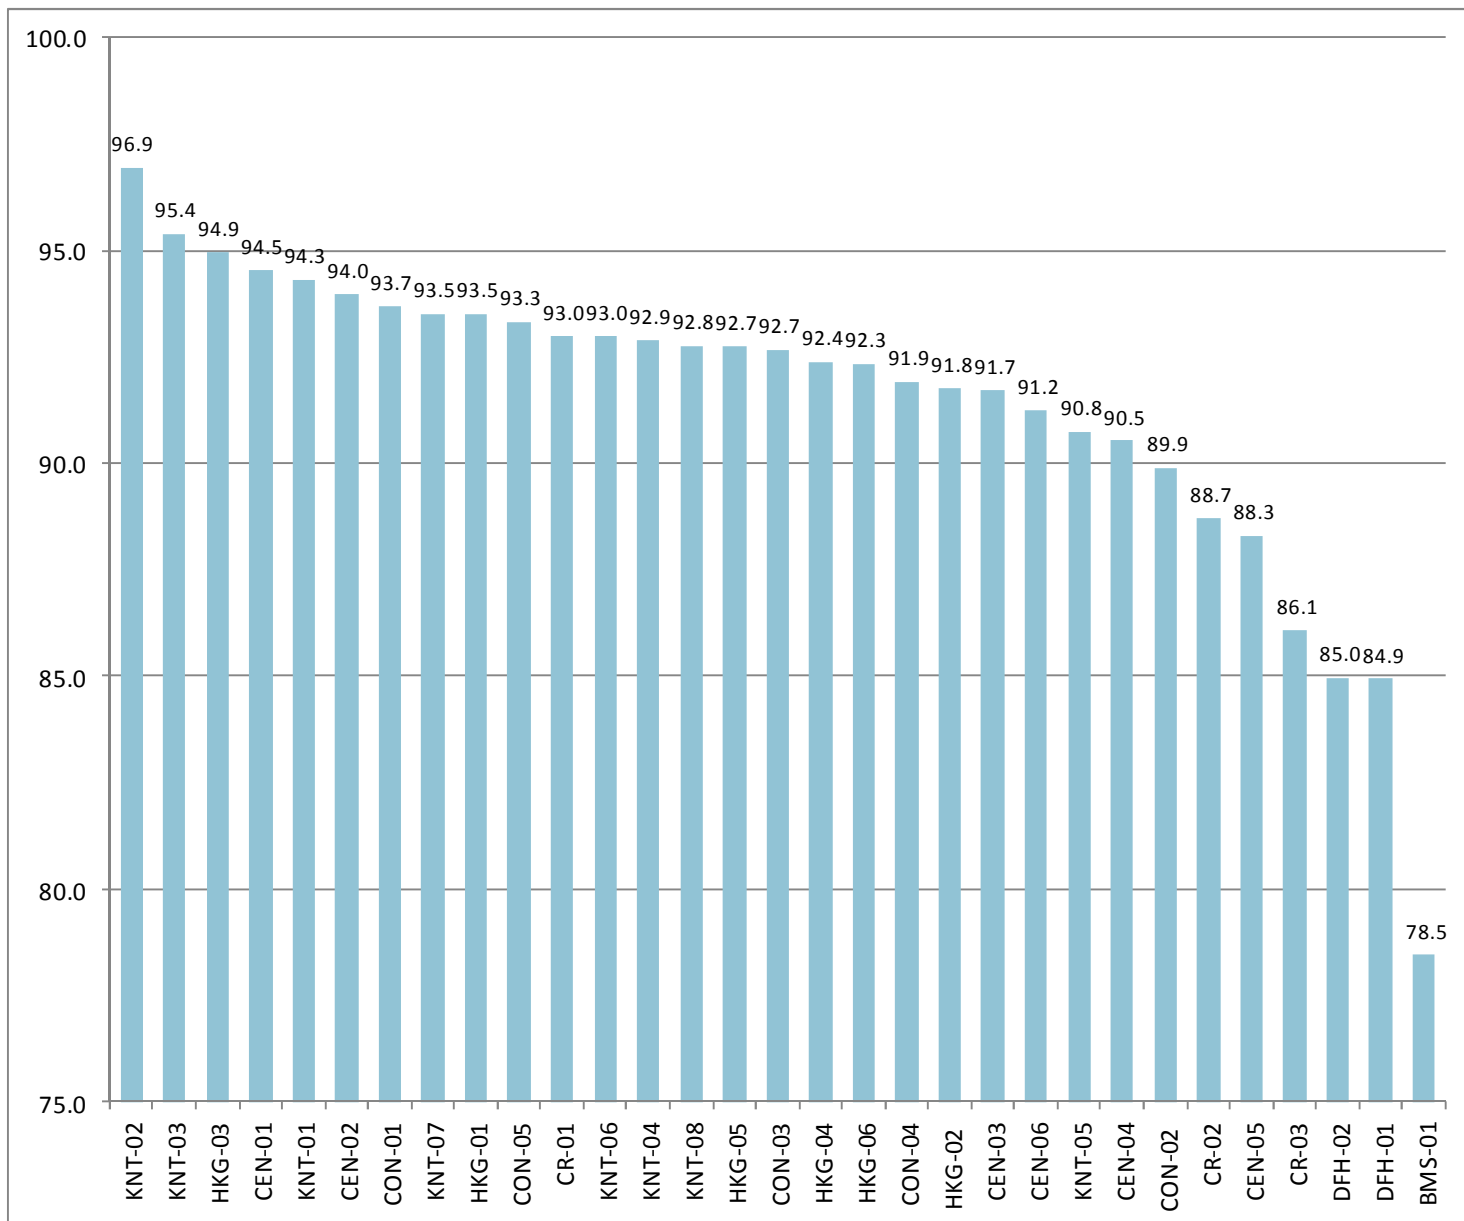

醒目提示:

- (1) supervisor 準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

EH&S問題請各同事於8月15日前透過互聯網參加7月份的問答比賽，有關問答比賽的連結如下：

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/s/field201407>
- 寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/s/office201407>

溫馨提示及留意：凡請各員工根據員工咭上的工號及所屬組別提供資料作答EH&S問答比賽問題，而各員工之分數以最先進入問題內的時間為準。
