





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

安全審核結果 開利香港




員工需於離地超過兩米之位置進行工作，
但沒有提供合適的工作台

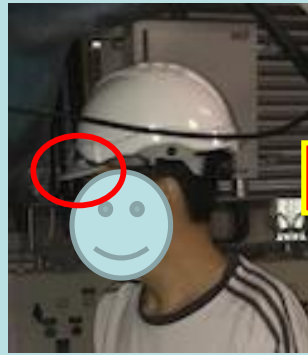


員工沒有正佩戴帽繩，經訓示後已正確
佩戴

集寶香港電子保安部

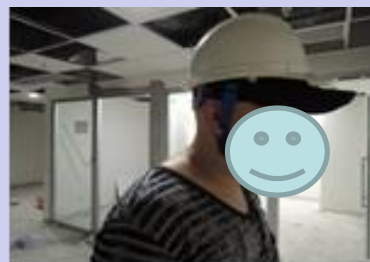

在安全審核中發現工友於安全帽內戴上其他帽，跟據安全指引，所有安全帽內不可佩戴其他帽，以避免減低安全帽之保護性。



在安全審核中發現工友於進行鑽孔工程時，未有佩戴眼罩。經勸喻後，已即時戴上眼罩繼續工作。



審核中發現有手提電力工具未有貼上安全檢查標籤。提醒員工必須進行每月安全檢查並貼上安全檢查標籤。



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

CCS EH&S Bulletin News

CCS環境、健康及安全通訊

2018

五月

安全審核結果

集寶香港消防部





泵房內，不良的工地整理、佈滿配件，沒有通道，增加了絆倒的危害。

應收拾尚未安裝的配件，保持通道暢通。

CCS澳門

主管在巡查期間發現員工在做JHA時沒有把不在列的危害寫出來。


如不在列的危害應在“其他危害”中列出，以作出相應的改善措施。

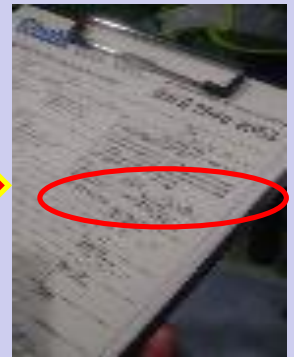

危害工地的改善情況

開利香港

當員工進行保養工序時，發現水掣位置凸出，容易對員工構成碰頭之危險。匯報上司得到主管批准，於水掣位置加上軟墊及貼上警告標示，以提醒在場人仕對碰頭位置提高警覺性及減輕員工撞頭受傷之嚴重性。

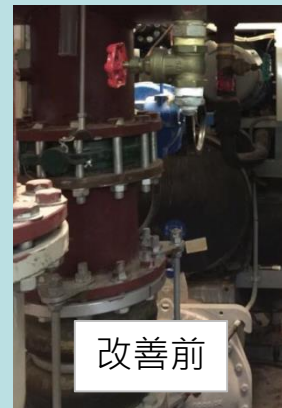

改善前



改善後

「環境、健康
及安全」網址

QR Code





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

CCS EH&S Bulletin News

CCS環境、健康及安全通訊

2018



五月

集寶香港電子保安部

在施工的通道，發現有電線散佈於地面，有絆倒的風險。其後，即時通知相關主管收拾相關電線。



改善前

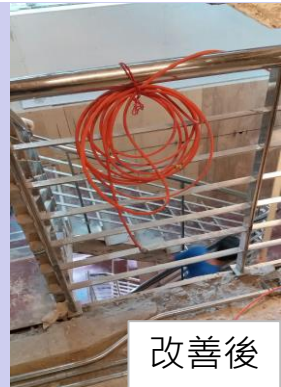

改善後

集寶香港消防部



改善前




改善後

蹣起的鐵線及不平地面會容易導致絆倒。通知工地承判商立刻加裝木條遮蓋鐵線及，保持通道良好。



工人在伺服器房工作時發現工地的5S情況欠佳，從而出現絆倒危機。

經工人主動匯報給主管後，已收拾好施工位，並清除所有潛在絆倒危害。

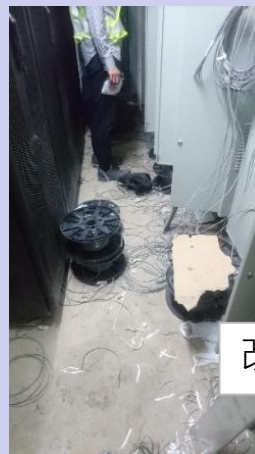

改善前



改善後

「環境、健康
及安全」網址

QR Code





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation


CCS EH&S Bulletin News

CCS環境、健康及安全通訊

2018

五月

2018年截至3月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

